

DOKUMEN PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK

Scrum Document

Usulan Pengembangan, Pembangunan, dan Implementasi Sistem Terintegrasi *Repository* dan *Dashboard* Data Akreditasi

Versi: Draft-31/05/2026

untuk:

SPSI STEI

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 06

Muhamad Nazih Najmudin	13523144
Andri Nurdianto	13523145
Ardell Aghna Mahendra	13523151
Hasri Fayadh Muqaffa	13523156
I Made Wiweka Putera	13523160

Program Studi Teknik Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

	Nomor Dokumen		Halaman
	<i>IF-ITB-IF3250-PPL-SD-2026</i>		<#>/<59 #
	Revisi	5	Tgl: 31/05/2026

Daftar Isi

1 Pendahuluan	3
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	4
1.2 Pemilik Perangkat Lunak	4
1.3 Manfaat Perangkat Lunak	4
1.4 Aturan Penomoran	4
1.5 Referensi	4
1.6 Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)	4
2 Kebutuhan Perangkat Lunak	5
2.1 Deskripsi Umum	5
2.2 Product Backlog	5
2.3 Release Planning	6
3 Pelaksanaan Sprint 1	8
3.1 Sprint Planning	8
3.2 Daily Meeting	10
3.2.1. Daily Meeting ke-1	10
3.2.2. Daily Meeting ke-2	12
3.2.3. Daily Meeting ke-3	13
3.2.4. Daily Meeting ke-4	14
3.2.5. Daily Meeting ke-5	15
3.3 Sprint Review	16
3.4 Sprint Retrospective	17
4 Pelaksanaan Sprint 2	17
4.1 Sprint Planning	17
4.2 Daily Meeting	20
4.2.1. Daily Meeting ke-1	20
4.2.2. Daily Meeting ke-2	22
4.2.3. Daily Meeting ke-3	23
4.2.4. Daily Meeting ke-4	25
4.2.5. Daily Meeting ke-5	26
4.2.6. Daily Meeting ke-6	28
4.3 Sprint Review	29
4.4 Sprint Retrospective	29
5 Pelaksanaan Sprint 3	30
5.1 Sprint Planning	30
5.2 Daily Meeting	32
5.2.1. Daily Meeting ke-1	32
5.2.2. Daily Meeting ke-2	33
5.2.3. Daily Meeting ke-3	35
5.2.4. Daily Meeting ke-4	36
5.2.5. Daily Meeting ke-5	37
5.2.6. Daily Meeting ke-6	38
5.3 Sprint Review	39
5.4 Sprint Retrospective	39
6 Pelaksanaan Sprint 4	40
6.1 Sprint Planning	40
6.2 Daily Meeting	42

6.2.1. Daily Meeting ke-1	42
6.2.2. Daily Meeting ke-2	43
6.2.3. Daily Meeting ke-3	45
6.2.4. Daily Meeting ke-4	46
6.2.5. Daily Meeting ke-5	47
6.2.6. Daily Meeting ke-6	48
6.3 Sprint Review	49
6.4 Sprint Retrospective	49
7 Pelaksanaan Sprint 5	50
7.1 Sprint Planning	50
7.2 Daily Meeting	52
7.2.1. Daily Meeting ke-1	52
7.2.2. Daily Meeting ke-2	53
7.2.3. Daily Meeting ke-3	54
7.2.4. Daily Meeting ke-4	55
7.2.5. Daily Meeting ke-5	56
7.2.6. Daily Meeting ke-6	57
7.3 Sprint Retrospective	58

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini berisi rekam jejak pelaksanaan metodologi Scrum dalam proses pengembangan Sistem Terintegrasi *Repository* dan *Dashboard* Data Akreditasi untuk SPSI STEI ITB. Tujuan utama pembuatan dokumen ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan rilis (*Release Planning*), daftar pekerjaan (*Product Backlog*), serta pelaporan siklus sprint yang mencakup *Sprint Planning*, *Daily Meeting*, *Sprint Review*, dan *Sprint Retrospective*. Target pembaca dokumen ini meliputi *Product Owner*, *Scrum Master*, *Development Team* (Kelompok 06), asisten, serta tim pengajar mata kuliah IF3250 Proyek Perangkat Lunak sebagai instrumen evaluasi kemajuan proyek.

1.2 Pemilik Perangkat Lunak

Pemilik perangkat lunak ini adalah Mohammad Mukhlis sebagai admin institusi dari ITB dan Koko Panji Komara dari SPSI STEI ITB selaku *Product Owner*.

1.3 Manfaat Perangkat Lunak

Manfaat perangkat lunak dari Sistem Terintegrasi *Repository* dan *Dashboard* Data Akreditasi, yaitu:

1. Sebagai *platform* bagi pimpinan untuk melakukan pemantauan *progress* akreditasi dari 11 program studi yang ada di STEI secara *real-time* dan membandingkan capaian antar *unit* melalui ringkasan *dashboard* institusi.
2. Sebagai *platform* yang memfasilitasi tim prodi dalam mengelola pengisian dokumen LKPS dalam *format Excel* dan dokumen LED dalam *format Word*, sehingga dapat diunduh secara otomatis setelah data dimasukkan.
3. Sebuah *platform* yang menyediakan fitur *early warning* melalui notifikasi peringatan dan status warna kesiapan untuk mengidentifikasi indikator kritis yang belum memenuhi target sebelum memenuhi batas waktu penilaian.
4. Sebagai sistem untuk melakukan simulasi skor akreditasi berdasarkan matriks penilaian lembaga untuk memprediksi hasil akhir dan memberikan gambaran kesiapan prodi sebelum penilaian final oleh asesor.
5. Sebagai pusat data akreditasi terpusat yang memastikan seluruh dokumen *evidence* dan data dikoordinasikan secara sistematis untuk menghindari risiko data hilang atau tercecer di berbagai media penyimpanan yang berbeda.

1.4 Aturan Penomoran

Aturan penomoran pada dokumen ini:

1. PB-XX, dengan XX adalah nomor *product backlog*.
2. S-XX-YY, dengan XX adalah nomor sprint dan YY adalah nomor urutan *task*.

1.5 Referensi

Adapun referensi yang digunakan dalam proyek ini antara lain:

1. Modul mata kuliah IF2150 Rekayasa Perangkat Lunak
2. Modul mata kuliah WI2022 Manajemen Proyek.
3. Modul mata kuliah IF3250 Proyek Perangkat Lunak
4. Dokumen Struktur *Dashboard* dari Client: [Struktur Dashboard untuk 11 Program Studi.docx](#)
5. Contoh Template LKPS: [laporan-kinerja-program-studi-aps-akademik-vokasi-dan-psppi.xlsx](#)
6. Contoh Template LED: [template-ledps-lam-teknik-reguler-instrumen-lam-teknik-2025-ver-2.docx](#)

1.6 Deskripsi Umum Dokumen (Ikhtisar)

Sistematika pembahasan dalam dokumen ini diuraikan bab per bab sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan: Menguraikan tujuan penulisan dokumen, identitas pemilik perangkat lunak, manfaat perangkat lunak, aturan penomoran yang digunakan, referensi rujukan, serta deskripsi umum isi dokumen.
- Bab 2 Kebutuhan Perangkat Lunak: Memaparkan deskripsi umum sistem yang dibangun beserta konteksnya, daftar *Product Backlog* lengkap dari awal hingga akhir, dan *Release Planning* yang memetakan target *backlog* pada setiap iterasi sprint.

Program Studi Teknik Informatika ITB	IF-ITB-IF3250-PPL-2024	Halaman 4/ dari 59 halaman
--------------------------------------	------------------------	----------------------------

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika-ITB, serta bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika ITB.

- Bab 3 Pelaksanaan Sprint 1: Mendokumentasikan eksekusi Sprint 1, meliputi Sprint Goal dan daftar tugas (*Sprint Planning*), catatan harian (*Daily Meeting*), evaluasi hasil (*Sprint Review*), dan evaluasi proses kerja tim (*Sprint Retrospective*).
- Bab 4 Pelaksanaan Sprint 2: Mendokumentasikan eksekusi Sprint 2 (meliputi *Planning*, *Daily Meeting*, *Review*, dan *Retrospective*).
- Bab 5 Pelaksanaan Sprint 3: Mendokumentasikan eksekusi Sprint 3 dengan struktur pelaporan yang sama.
- Bab 6 Pelaksanaan Sprint 4: Mendokumentasikan eksekusi Sprint 4 dengan struktur pelaporan yang sama.
- Bab 7 Pelaksanaan Sprint 5: Mendokumentasikan eksekusi Sprint 5 sebagai tahap akhir siklus pengembangan.

2 Kebutuhan Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum

Perangkat lunak dibuat dengan tujuan untuk memantau proses akreditasi dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB. Perangkat lunak dikembangkan untuk membantu pimpinan institusi dan admin STEI dalam memantau dokumen yang diperlukan dalam penilaian akreditasi. Selain itu, perangkat lunak membantu admin dan kaprodi dari setiap prodi dapat memantau dan meninjau dokumen yang harus dikirim oleh dosen dalam proses akreditasi.

2.2 Product Backlog

Tabel 2.1 *Product Backlog*

ID	Product Backlog	User Story
PB-01	<i>Repository Setup</i>	-
PB-02	<i>Base Component Development</i>	-
PB-03	<i>Other Core Component</i>	-
PB-04	<i>Deployment and Testing</i>	-
PB-05	User Authentication (Separation of Role)	Sebagai Pengguna, saya ingin dapat masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar dan diarahkan ke tampilan <i>dashboard</i> sesuai <i>role</i> saya.
PB-06	SSO ITB <i>Integration</i>	Sebagai Pengguna, saya ingin dapat masuk ke dalam sistem menggunakan akun SSO ITB.
PB-07	<i>Dashboard</i> institusi: Summary 11 Prodi	Sebagai Super Admin dan Dekanat/Bukabag, saya ingin dapat melihat ringkasan kesiapan akreditasi seluruh 11 program studi di STEI dalam satu <i>dashboard</i> institusi, termasuk indikator warna kesiapan dan persentase pengisian LKPS/LED tiap prodi, waktu berlaku akreditasi, simulasi skor kuantitatif otomatis dan kualitatif manual, serta melihat detail dari LKPS/LED yang diisi.
PB-08	<i>Dashboard</i> Per Prodi	Sebagai Super Admin, Dekanat/Bukabag, dan Kaprodi, saya ingin dapat melihat <i>dashboard</i> detail per program studi yang menampilkan profil prodi, progres pengisian indikator secara detail (per kriteria), estimasi skor akreditasi, dan status dokumen.
PB-09	Manajemen Pengguna	Sebagai Super Admin, saya ingin dapat mengelola akun pengguna sistem (menambah, mengubah, menonaktifkan, dan menugaskan pengguna ke program studi).
PB-10	Profil Prodi	Sebagai Kaprodi, saya ingin dapat melihat dan mengelola informasi profil program studi saya.
PB-11	Formulir Pengisian Data LKPS Per Prodi	Sebagai Kaprodi dan Tim Prodi, saya ingin dapat mengisi data kuantitatif LKPS per tabel dan kriteria melalui <i>spreadsheet</i> digital.
PB-12	Formulir Pengisian LED Per Prodi	Sebagai Kaprodi dan Tim Prodi, saya ingin dapat menyusun narasi dokumen LED per kriteria menggunakan <i>rich text editor</i> .

ID	Product Backlog	User Story
PB-13	Penyimpanan Draft Secara Otomatis	Sebagai Kaprodi dan Tim Prodi, saya ingin data LKPS dan LED yang sedang saya kerjakan tersimpan secara otomatis maupun manual sebagai draft.
PB-14	Penugasan Anggota Tim Prodi ke Indikator	Sebagai Super Admin dan Kaprodi, saya ingin dapat menugaskan anggota Tim Prodi sebagai <i>PIC</i> (Penanggung Jawab) pada kriteria atau indikator akreditasi tertentu, di mana satu anggota dapat ditugaskan di lebih dari satu prodi.
PB-15	Manajemen Unggahan Dokumen <i>Evidence</i>	Sebagai Kaprodi dan Tim Prodi, saya ingin dapat mengunggah dokumen <i>evidence</i> ke <i>repository</i> program studi dan menghubungkannya ke indikator atau kriteria akreditasi yang sesuai.
PB-16	<i>Repository</i> Dokumen Contoh dan Template	Sebagai Super Admin, saya ingin dapat mengunggah template dan dokumen contoh LKPS serta LED ke <i>repository</i> sistem.
PB-17	Fitur <i>Import</i> dan <i>Parsing</i> LKPS	Sebagai Kaprodi dan Tim Prodi, saya ingin dapat mengimpor <i>file Excel</i> LKPS yang sudah ada ke dalam sistem dengan <i>parsing</i> data otomatis.
PB-18	Fitur <i>Import</i> LED	Sebagai Kaprodi dan Tim Prodi, saya ingin dapat mengimpor <i>file Word</i> LED yang sudah ada ke dalam sistem sebagai arsip digital agar dapat dilihat/diakses/diunduh di kemudian hari.
PB-19	Fitur Ekspor/Unduh Dokumen LKPS ke <i>Format</i> Standar Nasional	Sebagai Super Admin, Dekanat/Bukabag, dan Kaprodi, saya ingin dapat mengunduh dokumen LKPS dalam <i>format Excel</i> sesuai template nasional BAN-PT/LAM Teknik.
PB-20	Fitur Ekspor/Unduh Dokumen LED ke <i>Format</i> Standar Nasional	Sebagai Super Admin, Dekanat/Bukabag, dan Kaprodi, saya ingin dapat mengunduh dokumen LED dalam <i>format Word</i> sesuai template nasional BAN-PT/LAM Teknik.
PB-21	Fitur Simulasi Skor Akreditasi	Sebagai Super Admin, Dekanat/Bukabag, dan Kaprodi, saya ingin dapat melihat simulasi dan estimasi skor akreditasi per butir indikator berdasarkan matriks penilaian BAN-PT/LAM Teknik, di mana penilaian kuantitatif dihitung secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput dan penilaian kualitatif diisi secara manual.
PB-22	Mekanisme Penguncian Data (Draft/Final)	Sebagai Super Admin dan Kaprodi, saya ingin dapat mengubah status dokumen LKPS/LED dari Draft menjadi Final dan menguncinya agar tidak dapat diubah oleh orang lain dan membuka kembali kunci dokumen jika diperlukan revisi lanjutan.
PB-23	Sinkronisasi Pusat Data Institusi	Sebagai Super Admin, saya ingin data kuantitatif terpusat yang saya input (seperti data mahasiswa, lulusan, dan keuangan) dapat tersinkronisasi secara otomatis ke formulir LKPS seluruh 11 program studi.
PB-24	<i>Early Warning</i> dan <i>Notification System</i>	Sebagai Super Admin dan Dekanat/Bukabag, saya ingin menerima notifikasi peringatan otomatis ketika capaian indikator akreditasi berada di bawah <i>passing grade</i> yang telah ditetapkan.
PB-25	Monitoring dan Riwayat Perbaikan	Sebagai Super Admin, Kaprodi, dan Dekanat/Bukabag, saya ingin dapat melakukan <i>review</i> terhadap konten LKPS, LED, dan dokumen <i>evidence</i> yang diinput tim prodi dan menambahkan catatan monitoring dan evaluasi pada indikator yang memerlukan perbaikan.
PB-26	Manajemen Sertifikat dan Masa Berlaku Akreditasi	Sebagai Super Admin, saya ingin dapat mengunggah sertifikat akreditasi dan mengatur informasi masa berlaku akreditasi per prodi.

2.3 Release Planning

Tabel 2.2 merupakan rencana rilis dari setiap sprint.


Program Studi Teknik Informatika ITB	IF-ITB-IF3250-PPL-2024	Halaman 6/ dari 59 halaman
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika-ITB, serta bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika ITB.		

Tabel 2.2 Release Planning

Sprint	Goals	ID Product Backlog
1	Membangun fondasi teknis proyek (<i>repository, environment, design system, CI/CD</i>), melakukan implementasi sistem autentikasi berbasis <i>role</i> dan SSO ITB, dan membangun halaman manajemen akun dan kerangka <i>dashboard</i> institusi.	PB-01, PB-02, PB-03, PB-05, PB-06, PB-07, PB-09
2	Melakukan revisi dari pengerjaan <i>sprint</i> 1, mengimplementasi perubahan <i>role</i> sistem (dari 5 <i>role</i> jadi 4 <i>role</i>), membangun kerangka <i>dashboard</i> prodi dan profil prodi, mengimplementasi fitur penugasan anggota Tim prodi, dan membangun fitur Impor dan Ekspor LKPS dan LED	PB-02, PB-07, PB-08, PB-10, PB-14, PB-17, PB-18, PB-19, PB-20
3	Melakukan revisi <i>sprint</i> 2 (FE <i>fetch</i> real data ke BE), membangun formulir pengisian data LKPS per prodi melalui <i>spreadsheet</i> digital, membangun formulir pengisian narasi LED per prodi menggunakan <i>rich text editor</i> , mengimplementasi penyimpanan draft otomatis dan manual untuk LKPS dan LED, membangun fitur manajemen unggahan dokumen <i>evidence</i> beserta <i>tagging</i> ke indikator, dan membangun <i>repository</i> dokumen contoh dan template untuk Super Admin.	PB-08, PB-11, PB-12, PB-13, PB-15, PB-16, PB-17
4	Melakukan revisi <i>sprint</i> 3 Melakukan revisi <i>sprint</i> 3 (memperbaiki nama prodi untuk pengisian <i>evidence</i> , Membuat fitur <i>upload</i> foto untuk LED, dan fitur hyperlink LED) Membuat fitur simulasi skor akreditasi. Membuat mekanisme penguncian data (draft/final). Membuat Sinkronisasi pusat data institusi. Membuat <i>Early Warning</i> dan <i>Notification System</i> . Membuat manajemen sertifikat dan masa berlaku akreditasi.	PB-12, PB-15, PB-21, PB-22, PB-23, PB-24, PB-26
5	Melakukan perbaikan menyeluruh terhadap bug dan error yang ditemukan dari akumulasi seluruh <i>sprint</i> keberjalanan proyek. Melakukan penyesuaian konsistensi visual, mencakup sidebar, page, dan toast. Menyiapkan lingkungan deployment dan menyesuaikan konfigurasi production aplikasi. Melakukan pengetesan akhir fungsionalitas aplikasi.	PB-04, PB-25

3 Pelaksanaan Sprint 1

3.1 Sprint Planning

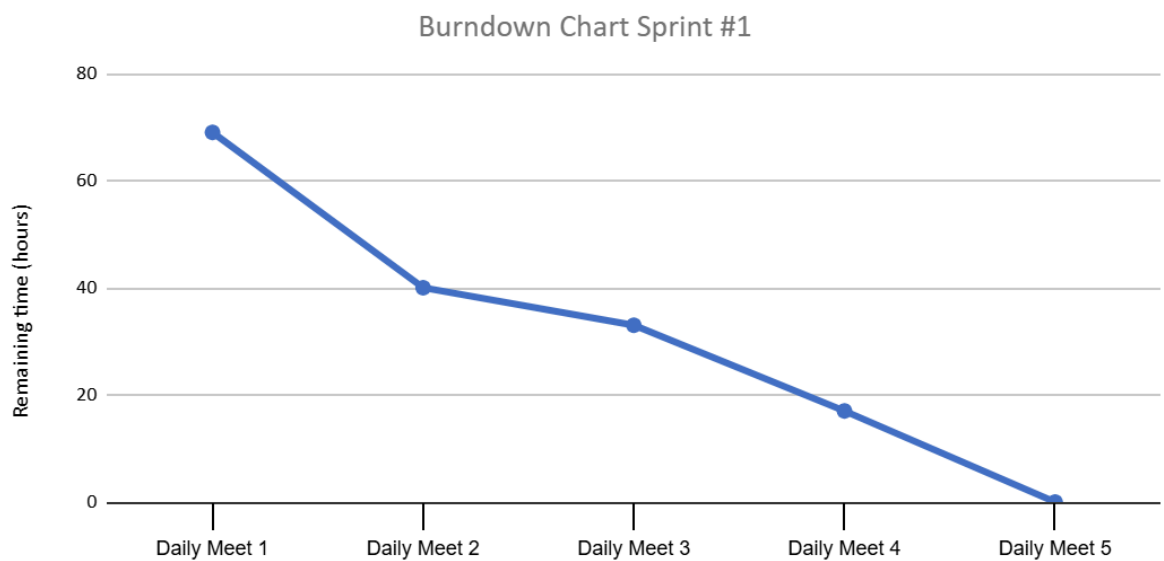

Gambar 3.1 Burndown Chart Sprint 1

Sprint Goal:

- 1. Membangun fondasi teknis proyek (*repository, environment, design system, CI/CD*)
- 2. Melakukan implementasi sistem autentikasi berbasis *role* dan SSO ITB
- 3. Membangun halaman manajemen akun
- 4. Membangun kerangka *dashboard* institusi

Tabel 3.1 *Sprint Backlog*

ID	Task	Description	Estimas i Waktu (jam)	ID Product Backlog	PIC
S-01-01	Inisiasi Repository	Menginisialisasi Repository di Gitlab	1	PB-01	Hasri Fayadh Muqaffa
S-01-02	Frontend Repository Setup	Membuat struktur folder proyek frontend (Next.js + TypeScript)	1	PB-01	Hasri Fayadh Muqaffa
S-01-03	Backend Repository Setup	Membuat struktur folder proyek backend (Express.js)	1	PB-01	Hasri Fayadh Muqaffa
S-01-04	CI/CD Setup	Mengkonfigurasi file .gitlab-ci.yml dengan lint, build, test, dan deploy otomatis ke staging, serta memastikan pipeline berjalan saat merge request ke branch develop	2	PB-01	Andri Nurdianto
S-01-05	Environment Variables Setup	Membuat file .env.example untuk frontend dan backend terutamanya, mendefinsiikan semua variabel (DB_URL, JWT_SECREY, SSO CLIENT ID, etc), dan	1	PB-02	Hasri Fayadh Muqaffa

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimasi Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
		mendokumentasikan cara setup di README			
S-01-06	Database Setup	Mengkonfigurasi koneksi PostgreSQL, menyiapkan <i>Prisma</i> sebagai <i>ORM</i> , membuat schema awal, menjalankan migrasi pertama, dan melakukan verifikasi koneksi berhasil di <i>environment</i> lokal dan <i>staging</i>	3	PB-02	Muhamad Nazih Najmudin
S-01-07	Design System Setup	Mengkonfigurasi dokumentasi untuk integrasi Frontend dan <i>Backend</i> , mendefinisikan <i>token</i> desain yang konsisten, dan membuat komponen UI dasar yang reusable.	4	PB-02	I Made Wiweka Putera
S-01-08	API-Documentation Setup	Mengkonfigurasi Swagger/OpenAPI pada <i>backend</i> agar setiap endpoint terdokumentasi otomatis. Halaman dokumentasi dapat diakses di <i>/api/docs</i> .	2	PB-03	Ardell Aghna Mahendra
S-01-09	AU Interface Design	Membuat desain antarmuka halaman <i>Login</i> mencakup <i>layout form</i> , <i>state</i> validasi, dan responsivitas.	2	PB-05	I Made Wiweka Putera
S-01-10	DB Migration for Auth	Membuat dan menjalankan migrasi tabel users.	2	PB-05	Muhamad Nazih Najmudin
S-01-11	Endpoint Setup	Mendaftarkan route autentikasi pada router. Menghubungkan route ke <i>controller</i>	1	PB-05	Ardell Aghna Mahendra
S-01-12	Signup and <i>Login</i> Functionality <i>API</i>	Mengimplementasi logika <i>login</i>	4	PB-05	Ardell Aghna Mahendra
S-01-13	Protected Route Setup	Membuat <i>middleware</i> verify SSO di setiap <i>request</i> ke endpoint yang terproteksi dan membuat verify <i>Role</i> untuk membatasi akses berdasarkan <i>role</i> .	2	PB-05	Hasri Fayadh Muqaffa
S-01-14	Auth Functionality <i>API</i> Testing & Documentation	Membuat <i>unit test</i> dan <i>integration test</i> untuk semua endpoint auth menggunakan <i>Jest/Supertest</i> .	3	PB-05	Andri Nurdianto
S-01-15	FE <i>Login</i> Page	Membuat tampilan halaman <i>login</i>	3	PB-05	I Made Wiweka Putera
S-01-16	<i>Login</i> Page Integration & Testing	Integrasi end-to-end halaman <i>login</i> dengan <i>API</i>	2	PB-05	Andri Nurdianto

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimas i Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
S-01-17	SSO Setup	Menginisiasi OAuth2 <i>client</i> untuk <i>login</i> menggunakan SSO akun ITB	4	PB-06	Hasri Fayadh Muqaffa
S-01-18	Credential Functionality <i>API</i>	Mengimplementasikan endpoint <i>callback</i> SSO, menerima <i>token</i> dari SSO ITB, memverifikasi identitas, memetakan <i>role</i> berdasarkan data institusi, dan menghasilkan <i>JWT internal</i> sistem.	3	PB-06	Muhamad Nazih Najmudin
S-01-19	DB Migration for Account	Membuat migrasi tabel <i>prodi</i> dan memperbarui relasi tabel <i>users</i> ke <i>prodi</i> .	2	PB-07	Muhamad Nazih Najmudin
S-01-20	Account Management Endpoint Setup	Mendaftarkan route CRUD akun.	1	PB-07	Ardell Aghna Mahendra
S-01-21	Account Management <i>API</i> Functionalities	Mengimplementasikan logika CRUD akun.	4	PB-07	Hasri Fayadh Muqaffa
S-01-22	Account Management <i>API</i> Testing & Documentation	Membuat <i>unit test</i> untuk semua endpoint manajemen akun.	2	PB-07	Andri Nurdianto
S-01-23	FE Account Management Page	Membuat tampilan halaman manajemen akun	5	PB-07	I Made Wiweka Putera
S-01-24	Account Management Page <i>Integration & Testing</i>	Integrasi halaman manajemen akun dengan <i>API</i> .	2	PB-07	Andri Nurdianto
S-01-25	<i>Sidebar, Header, and Dashboard Interface Design</i>	Membuat desain antarmuka untuk <i>sidebar</i> , <i>header</i> , dan <i>dashboard</i>	3	PB-09	Ardell Aghna Mahendra
S-01-26	FE <i>Sidebar</i>	Membuat tampilan <i>sidebar</i>	3	PB-09	Andri Nurdianto
S-01-27	FE <i>Header</i>	Membuat tampilan <i>header</i>	2	PB-09	Ardell Aghna Mahendra
S-01-28	FE <i>Dashboard</i>	Membuat tampilan <i>dashboard</i>	4	PB-09	Muhamad Nazih Najmudin

3.2 Daily Meeting

3.2.1. Daily Meeting ke-1

Tabel 3.2 Status Kanban Board Daily Meeting 1

<i>Daily Meet 1</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
			S-01-01			
			S-01-02			
			S-01-03			

	S-01-04					
S-01-05						
	S-01-06					
	S-01-07					
S-01-08						
	S-01-09					
	S-01-10					
	S-01-11					
	S-01-12					
S-01-13						
S-01-14						
S-01-15						
S-01-16						
S-01-17						
S-01-18						
S-01-19						
	S-01-20					
S-01-21						
S-01-22						
S-01-23						
S-01-24						
	S-01-25					
S-01-26						
S-01-27						
	S-01-28					

Tabel 3.3 Laporan Progres *Daily Meeting* 1

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	Bergabung dalam project <i>Gitlab</i>	
2	Andri Nurdianto		
3	Ardell Aghna Mahendra		
4	Hasri Fayadh Muqaffa		
5	I Made Wiweka Putera		

Tabel 3.4 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 1

N o	Hambatan

3.2.2. Daily Meeting ke-2

Tabel 3.5 Status Kanban Board Daily Meeting 2

Daily Meet 2						
Open	To Do	Ready	Work-In-Progress	Review	Testing	Closed
						S-01-01
						S-01-02
						S-01-03
						S-01-04
		S-01-05				
						S-01-06
						S-01-07
		S-01-08				
					S-01-09	
					S-01-10	
					S-01-11	
					S-01-12	
S-01-13						
	S-01-14					
	S-01-15					
	S-01-16					
S-01-17						
S-01-18						
			S-01-19			
					S-01-20	
S-01-21						
	S-01-22					
	S-01-23					
	S-01-24					
					S-01-25	
S-01-26						
S-01-27						
					S-01-28	

Tabel 3.6 Laporan Progres Daily Meeting 2

No	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-01-06, S-01-10	S-01-18, S-01-19
2	Andri Nurdianto	S-01-04	S-01-14, S-01-22
3	Ardell Aghna Mahendra	S-01-20, S-01-11, S-01-12, S-01-25	S-01-27, S-01-08

4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-01-01, S-01-02, S-01-03, S-01-05	S-01-13
5	I Made Wiweka Putera	S-01-07, S-01-09	S-01-15, S-01-23

Tabel 3.7 Daftar Hambatan *Daily Meeting 2*

N o	Hambatan
1	Setup <i>gitlab</i> CI/CD cukup memusingkan

3.2.3. *Daily Meeting ke-3*

Tabel 3.8 Status *Kanban Board Daily Meeting 3*

<i>Daily Meet 3</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
						S-01-01
						S-01-02
						S-01-03
						S-01-04
					S-01-05	
						S-01-06
						S-01-07
					S-01-08	
					S-01-09	
					S-01-10	
					S-01-11	
					S-01-12	
	S-01-13					
			S-01-14			
	S-01-15					
	S-01-16					
		S-01-17				
	S-01-18					
					S-01-19	
					S-01-20	
	S-01-21					
			S-01-22			
			S-01-23			
	S-01-24					

					S-01-25	
	S-01-26					
			S-01-27			
					S-01-28	

Tabel 3.9 Laporan Progres *Daily Meeting* 3

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-01-19	S-01-28
2	Andri Nurdianto		S-01-14, S-01-22
3	Ardell Aghna Mahendra	S-01-08	S-01-27
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-01-13	S-01-17
5	I Made Wiweka Putera	S-01-15	S-01-23

Tabel 3.10 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 3

N o	Hambatan

3.2.4. *Daily Meeting* ke-4

Tabel 3.11 Status *Kanban Board Daily Meeting* 4

<i>Daily Meet 4</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
						S-01-01
						S-01-02
						S-01-03
						S-01-04
					S-01-05	
						S-01-06
						S-01-07
					S-01-08	
					S-01-09	
					S-01-10	
					S-01-11	
					S-01-12	
		S-01-13				
					S-01-14	
			S-01-15			

			S-01-16			
					S-01-17	
			S-01-18			
					S-01-19	
					S-01-20	
		S-01-21				
					S-01-22	
					S-01-23	
			S-01-24			
					S-01-25	
		S-01-26				
					S-01-27	
					S-01-28	

Tabel 3.12 Laporan Progres *Daily Meeting* 4

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-01-28	S-01-18
2	Andri Nurdianto	S-01-14, S-01-22	S-01-24, S-01-26
3	Ardell Aghna Mahendra	S-01-27	
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-01-17	S-01-21
5	I Made Wiweka Putera	S-01-23	-

Tabel 3.13 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 4

N o	Hambatan
1	Untuk SSO, harus meminta <i>credential</i> sama ITB

3.2.5. *Daily Meeting* ke-5

Tabel 3.14 Status *Kanban Board Daily Meeting* 5

<i>Daily Meet 5</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
						S-01-01
						S-01-02
						S-01-03
						S-01-04
						S-01-05
						S-01-06

					S-01-07
					S-01-08
					S-01-09
					S-01-10
					S-01-11
					S-01-12
					S-01-13
					S-01-14
					S-01-15
					S-01-16
					S-01-17
					S-01-18
					S-01-19
					S-01-20
					S-01-21
					S-01-22
					S-01-23
					S-01-24
					S-01-25
					S-01-26
					S-01-27
					S-01-28

Tabel 3.15 Laporan Progres *Daily Meeting* 5

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-01-18	
2	Andri Nurdianto	S-01-24	S-01-26
3	Ardell Aghna Mahendra	S-01-27 (perbaikan dari sebelumnya)	
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-01-21	
5	I Made Wiweka Putera	-	-

Tabel 3.16 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 5

N o	Hambatan

3.3 Sprint Review

Catatan:

Program Studi Teknik Informatika ITB	IF-ITB-IF3250-PPL-2024	Halaman 16/ dari 59 halaman
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika-ITB, serta bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika ITB.		

1. Terdapat perubahan *role* dari 5 menjadi 4 *role*
2. Terdapat bug yaitu *layout* bagian progress di *dashboard* institusi menjadi kurang rapih
3. *Dropdown* pada penambahan anggota di manajemen akun tidak ada background
4. Terdapat kesalahan pada *Use Case diagram*

3.4 Sprint Retrospective

Apa yang perlu dilanjutkan:

1. Semangat tinggi anggota tim dalam memulai proyek dan menyelesaikan *task*
2. Koordinasi awal yang baik dalam membangun struktur *repository* dan *environment* proyek bersama

Apa yang perlu dimulai:


1. Pembaruan status pekerjaan pada *Kanban board* secara konsisten di setiap *Daily Meeting* agar perkembangan tugas terpantau oleh seluruh tim.

Apa yang perlu dihentikan:

- Tidak ada. Semua sejauh ini berjalan dengan baik.

4 Pelaksanaan Sprint 2

4.1 Sprint Planning

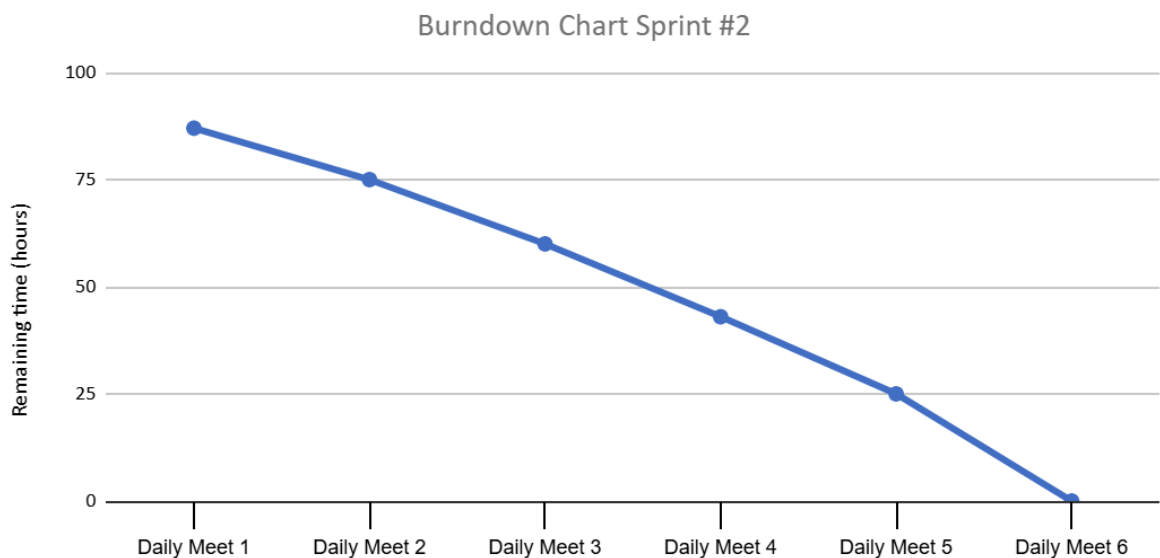

Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 2

Sprint Goal:

1. Melakukan revisi dari pengerjaan *sprint 1*
2. Mengimplementasi perubahan *role* sistem (dari 5 *role* jadi 4 *role*)
3. Membangun kerangka *dashboard* prodi dan profil prodi
4. Mengimplementasi fitur penugasan anggota Tim prodi
5. Membangun fitur impor dan ekspor LKPS dan LED

Tabel 4.1 *Sprint Backlog*

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimas i Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
S-02-01	Sprint 1 Revision	Memperbaiki <i>layout</i> progress di <i>Dashboard</i> Institusi, bug <i>update</i> akun, styling <i>dropdown</i> di halaman Manajemen Akun, dan card "Prodi Siap/Perlu Perhatian" menjadi clickable.	3	PB-07	Hasri Fayadh Muqaffa
S-02-02	DB Migration for <i>Role</i> Change	Mengubah <i>Role</i> dari 5 menjadi 4 <i>role</i> dan menambah <i>model-model</i> baru pada <i>schema.prisma</i> .	3	PB-02	Hasri Fayadh Muqaffa
S-02-03	<i>Role</i> System <i>Update</i>	Memperbarui <i>middleware</i> autentikasi, <i>service</i> akun, dan <i>validator</i> sesuai sistem <i>role</i> baru.	3	PB-02	Hasri Fayadh Muqaffa
S-02-04	Profil Prodi <i>Interface</i> Design	Membuat desain antarmuka halaman Profil Prodi dengan <i>form</i> edit info prodi dan tabel daftar anggota tim prodi.	2	PB-10	Ardell Aghna Mahendra
S-02-05	Profil Prodi Endpoint Setup	Mendaftarkan endpoint CRUD Profil Prodi pada router.	1	PB-10	Ardell Aghna Mahendra
S-02-06	Profil Prodi <i>API</i> Functionalities	Mengimplementasi logika bisnis CRUD Profil Prodi dan pengelolaan anggota tim prodi.	3	PB-10	Ardell Aghna Mahendra
S-02-07	Profil Prodi <i>API</i> Testing & Documentation	Membuat <i>unit test</i> dan dokumentasi Swagger untuk semua endpoint Profil Prodi.	2	PB-10	Andri Nurdianto
S-02-08	FE Profil Prodi	Membuat halaman Profil Prodi dengan <i>form</i> edit data prodi dan tabel daftar anggota tim prodi.	3	PB-10	Ardell Aghna Mahendra
S-02-09	Profil Prodi Page <i>Integration & Testing</i>	Mengintegrasikan halaman Profil Prodi dengan <i>API</i> dan memastikan alur CRUD berjalan end-to-end.	2	PB-10	Andri Nurdianto
S-02-10	<i>Dashboard</i> Per Prodi <i>Interface</i> Design	Membuat desain antarmuka <i>Dashboard</i> Per Prodi dengan info prodi, daftar indikator, status LKPS/LED, dan progress bar.	2	PB-08	Hasri Fayadh Muqaffa
S-02-11	<i>Dashboard</i> Per Prodi Endpoint Setup	Mendaftarkan endpoint <i>Dashboard</i> Per Prodi pada router.	1	PB-08	Hasri Fayadh Muqaffa
S-02-12	<i>Dashboard</i> Per Prodi <i>API</i> Functionalities	Mengimplementasi logika bisnis <i>Dashboard</i> Per Prodi yang menampilkan agregasi data indikator dan status dokumen.	3	PB-08	Hasri Fayadh Muqaffa
S-02-13	<i>Dashboard</i> Per Prodi <i>API</i> Testing & Documentation	Membuat <i>unit test</i> dan dokumentasi Swagger untuk	2	PB-08	Andri Nurdianto

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimas i Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
		endpoint <i>Dashboard</i> Per Prodi.			
S-02-14	FE <i>Dashboard</i> Per Prodi	Membuat halaman <i>Dashboard</i> Per Prodi dengan visualisasi progress indikator dan status dokumen LKPS/LED.	4	PB-08	Hasri Fayadh Muqaffa
S-02-15	<i>Dashboard</i> Per Prodi Page <i>Integration & Testing</i>	Mengintegrasikan halaman <i>Dashboard</i> Per Prodi dengan <i>API</i> dan memverifikasi agregasi data berjalan benar.	2	PB-08	Andri Nurdianto
S-02-16	Penugasan <i>Interface</i> Design	Membuat desain antarmuka halaman Penugasan dengan <i>dropdown</i> anggota Tim Prodi, daftar indikator, dan tabel penugasan aktif.	2	PB-14	Ardell Aghna Mahendra
S-02-17	Penugasan Endpoint Setup	Mendaftarkan endpoint Penugasan pada router.	1	PB-14	Ardell Aghna Mahendra
S-02-18	Penugasan <i>API</i> Functionalities	Mengimplementasi logika bisnis penugasan anggota Tim Prodi ke indikator oleh Super Admin dan Kaprodi.	4	PB-14	Ardell Aghna Mahendra
S-02-19	Penugasan <i>API Testing &</i> <i>Documentation</i>	Membuat <i>unit test</i> dan dokumentasi Swagger untuk semua endpoint Penugasan.	2	PB-14	Andri Nurdianto
S-02-20	FE Penugasan	Membuat halaman Penugasan dengan fitur <i>assign</i> anggota ke indikator dan tabel daftar penugasan aktif.	4	PB-14	Ardell Aghna Mahendra
S-02-21	Penugasan Page <i>Integration</i> <i>& Testing</i>	Mengintegrasikan halaman Penugasan dengan <i>API</i> dan memverifikasi alur penugasan berjalan benar.	2	PB-14	Andri Nurdianto
S-02-22	LKPS <i>Interface</i> Design	Membuat desain antarmuka halaman LKPS dengan area <i>file upload</i> , tabel preview data, dan tombol <i>download</i> .	2	PB-17	I Made Wiweka Putera
S-02-23	LKPS Endpoint Setup	Mendaftarkan endpoint LKPS pada router.	1	PB-17	I Made Wiweka Putera
S-02-24	LKPS <i>import</i> Functionality	Mengimplementasi fitur impor data LKPS dari <i>file Excel</i> ke <i>database</i> .	4	PB-17	I Made Wiweka Putera
S-02-25	LKPS <i>export</i> Functionality	Mengimplementasi fitur ekspor data LKPS dari <i>database</i> ke <i>file Excel</i> .	3	PB-19	I Made Wiweka Putera
S-02-26	LKPS <i>API Testing &</i> <i>Documentation</i>	Membuat <i>unit test</i> dan dokumentasi Swagger untuk endpoint impor/ekspor LKPS.	2	PB-17	Andri Nurdianto

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimas i Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
S-02-27	FE LKPS <i>import</i>	Membuat halaman impor LKPS dengan fitur <i>upload file Excel</i> dan notifikasi hasil impor.	3	PB-17	I Made Wiweka Putera
S-02-28	FE LKPS <i>export</i> Feature	Menambahkan tombol <i>download</i> LKPS yang mengunduh data sebagai <i>file Excel</i> .	2	PB-19	I Made Wiweka Putera
S-02-29	LKPS Page <i>Integration & Testing</i>	Mengintegrasikan fitur impor dan ekspor LKPS dengan <i>API</i> dan memverifikasi alur <i>upload</i> dan <i>download file</i> .	2	PB-17	I Made Wiweka Putera
S-02-30	LED <i>Interface</i> Design	Membuat desain antarmuka halaman LED dengan area <i>upload</i> dokumen <i>Word</i> dan tombol <i>download</i> .	2	PB-18	Muhamad Nazih Najmudin
S-02-31	LED Endpoint Setup	Mendaftarkan endpoint LED pada router.	1	PB-18	Muhamad Nazih Najmudin
S-02-32	LED <i>import</i> Functionality	Mengimplementasi fitur <i>upload file Word</i> LED sebagai arsip dokumen.	3	PB-18	Muhamad Nazih Najmudin
S-02-33	LED <i>export</i> Functionality	Mengimplementasi fitur <i>download file Word</i> LED yang telah diarsipkan.	2	PB-20	Muhamad Nazih Najmudin
S-02-34	LED <i>API Testing & Documentation</i>	Membuat <i>unit test</i> dan dokumentasi Swagger untuk endpoint impor/ekspor LED.	2	PB-18	Andri Nurdianto
S-02-35	FE LED <i>import</i>	Membuat halaman impor LED dengan fitur <i>upload file Word</i> dan notifikasi hasil impor.	3	PB-18	Muhamad Nazih Najmudin
S-02-36	FE LED <i>export</i> Feature	Menambahkan tombol <i>download</i> LED yang mengunduh data sebagai <i>file Word</i> .	2	PB-20	Muhamad Nazih Najmudin
S-02-37	LED Page <i>Integration & Testing</i>	Mengintegrasikan fitur impor dan ekspor LED dengan <i>API</i> dan memverifikasi alur <i>upload</i> dan <i>download file</i> .	2	PB-18	Muhamad Nazih Najmudin

4.2 Daily Meeting

4.2.1. Daily Meeting ke-1

Tabel 4.2 Status Kanban Board Daily Meeting 1

<i>Daily Meet 1</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
	S-02-01					

		S-02-02				
S-02-03						
		S-02-04				
	S-02-05					
	S-02-06					
S-02-07						
S-02-08						
S-02-09						
S-02-10						
S-02-11						
S-02-12						
S-02-13						
S-02-14						
S-02-15						
		S-02-16				
S-02-17						
S-02-18						
	S-02-19					
S-02-20						
S-02-21						
		S-02-22				
	S-02-23					
S-02-24						
S-02-25						
		S-02-26				
S-02-27						
S-02-28						
S-02-29						
S-02-30						
		S-02-31				
	S-02-32					
	S-02-33					
S-02-34						
S-02-35						
S-02-36						
S-02-37						

Tabel 4.3 Laporan Progres *Daily Meeting* 1

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	<i>Sprint Planning</i>	S-02-31
2	Andri Nurdianto		S-02-26

3	Ardell Aghna Mahendra		S-02-04, S-02-16
4	Hasri Fayadh Muqaffa		S-02-02, S-02-03
5	I Made Wiweka Putera		S-02-22

Tabel 4.4 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 1

N o	Hambatan

4.2.2. *Daily Meeting* ke-2

Tabel 4.5 Status *Kanban Board Daily Meeting* 2

<i>Daily Meet 2</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Progress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
			S-02-01			
					S-02-02	
S-02-03						
					S-02-04	
			S-02-05			
			S-02-06			
S-02-07						
S-02-08						
	S-02-09					
	S-02-10					
S-02-11						
S-02-12						
S-02-13						
S-02-14						
	S-02-14					
					S-02-16	
		S-02-17				
		S-02-18				
			S-02-19			
S-02-20						
S-02-21						
					S-02-22	
			S-02-23			
	S-02-24					

S-02-25						
					S-02-26	
S-02-27						
S-02-28						
S-02-29						
	S-02-30					
					S-02-31	
			S-02-32			
			S-02-33			
S-02-34						
S-02-35						
S-02-36						
S-02-37						

Tabel 4.6 Laporan Progres *Daily Meeting* 2

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-02-31	S-02-32, S-02-33
2	Andri Nurdianto	S-02-26	S-02-19
3	Ardell Aghna Mahendra	S-02-04, S-02-16	S-02-05, S-02-06
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-02-02	S-02-03, S-02-01
5	I Made Wiweka Putera	S-02-22	S-02-23

Tabel 4.7 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 2

N o	Hambatan

4.2.3. *Daily Meeting* ke-3

Tabel 4.8 Status Kanban Board *Daily Meeting* 3

<i>Daily Meet 3</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
					S-02-01	
					S-02-02	
S-02-03						
					S-02-04	
					S-02-05	
					S-02-06	

S-02-07						
S-02-08						
			S-02-09			
			S-02-10			
	S-02-11					
	S-02-12					
	S-02-13					
S-02-14						
		S-02-14				
					S-02-16	
			S-02-17			
			S-02-18			
					S-02-19	
	S-02-20					
S-02-21						
					S-02-22	
					S-02-23	
		S-02-24				
S-02-25						
					S-02-26	
	S-02-27					
S-02-28						
S-02-29						
			S-02-30			
					S-02-31	
					S-02-32	
					S-02-33	
S-02-34						
	S-02-35					
	S-02-36					
S-02-37						

Tabel 4.9 Laporan Progres *Daily Meeting* 3

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-02-32, S-02-33	S-02-30
2	Andri Nurdianto	S-02-19	S-02-09, S-02-15
3	Ardell Aghna Mahendra	S-02-05, S-02-06	S-02-17, S-02-18
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-02-03, S-02-01	S-02-10
5	I Made Wiweka Putera	S-02-23	S-02-24

Tabel 4.10 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 3

N o	Hambatan

4.2.4. *Daily Meeting* ke-4

Tabel 4.11 Status *Kanban Board Daily Meeting* 4

<i>Daily Meet 4</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
					S-02-01	
					S-02-02	
		S-02-03				
					S-02-04	
					S-02-05	
					S-02-06	
	S-02-07					
	S-02-08					
					S-02-09	
					S-02-10	
			S-02-11			
			S-02-12			
			S-02-13			
	S-02-14					
					S-02-14	
					S-02-16	
					S-02-17	
					S-02-18	
					S-02-19	
			S-02-20			
		S-02-21				
					S-02-22	
					S-02-23	
					S-02-24	
	S-02-25					
					S-02-26	
			S-02-27			
	S-02-28					
	S-02-29					

					S-02-30	
					S-02-31	
					S-02-32	
					S-02-33	
	S-02-34					
			S-02-35			
			S-02-36			
	S-02-37					

Tabel 4.12 Laporan Progres *Daily Meeting* 4

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-02-30	S-02-35, S-02-36
2	Andri Nurdianto	S-02-09, S-02-15	S-02-13, S-02-19
3	Ardell Aghna Mahendra	S-02-17, S-02-18	S-02-20, S-02-08
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-02-10	S-02-11, S-02-12
5	I Made Wiweka Putera	S-02-24	S-02-25

Tabel 4.13 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 4

N o	Hambatan

4.2.5. *Daily Meeting* ke-5

Tabel 4.14 Status *Kanban Board Daily Meeting* 5

<i>Daily Meet 5</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
					S-02-01	
					S-02-02	
			S-02-03			
					S-02-04	
					S-02-05	
					S-02-06	
		S-02-07				
		S-02-08				
					S-02-09	
					S-02-10	
					S-02-11	

					S-02-12	
					S-02-13	
		S-02-14				
					S-02-14	
					S-02-16	
					S-02-17	
					S-02-18	
					S-02-19	
					S-02-20	
			S-02-21			
					S-02-22	
					S-02-23	
					S-02-24	
		S-02-25				
					S-02-26	
					S-02-27	
			S-02-28			
			S-02-29			
					S-02-30	
					S-02-31	
					S-02-32	
					S-02-33	
			S-02-34			
					S-02-35	
					S-02-36	
			S-02-37			

Tabel 4.15 Laporan Progres *Daily Meeting* 5

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-02-35, S-02-36	S-02-37
2	Andri Nurdianto	S-02-13, S-02-19	S-02-34
3	Ardell Aghna Mahendra	S-02-20	S-02-08
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-02-11, S-02-12	S-02-14
5	I Made Wiweka Putera	S-02-27	S-02-28

Tabel 4.16 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 5

N o	Hambatan

--	--

4.2.6. Daily Meeting ke-6

Tabel 4.17 Status Kanban Board Daily Meeting 6

Daily Meet 6						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
						S-02-01
						S-02-02
						S-02-03
						S-02-04
						S-02-05
						S-02-06
						S-02-07
						S-02-08
						S-02-09
						S-02-10
						S-02-11
						S-02-12
						S-02-13
						S-02-14
						S-02-14
						S-02-16
						S-02-17
						S-02-18
						S-02-19
						S-02-20
						S-02-21
						S-02-22
						S-02-23
						S-02-24
						S-02-25
						S-02-26
						S-02-27
						S-02-28
						S-02-29
						S-02-30
						S-02-31
						S-02-32
						S-02-33
						S-02-34

						S-02-35
						S-02-36
						S-02-37

Tabel 4.18 Laporan Progres *Daily Meeting* 6

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-02-37	-
2	Andri Nurdianto	S-02-34	-
3	Ardell Aghna Mahendra	S-02-08	-
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-02-14	-
5	I Made Wiweka Putera	S-02-28	-

Tabel 4.19 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 6

N o	Hambatan

4.3 Sprint Review

Catatan:

1. *Overall* sudah aman
2. *Dashboard* prodi masih data *dummy*, harus diubah menjadi data asli

4.4 Sprint Retrospective

Apa yang perlu dilanjutkan:

1. Pembaruan status pekerjaan pada *Kanban board* yang konsisten dilakukan oleh seluruh anggota tim di setiap *Daily Meeting*, sehingga perkembangan tugas individu terpantau dengan jelas
2. Sikap proaktif anggota tim dalam menyelesaikan komponen fitur masing-masing secara mandiri sebelum tahap integrasi.
3. Keaktifan anggota dalam mengkomunikasikan segala kendala secara langsung di dalam grup kelompok

Apa yang perlu dimulai:


1. Membangun komunikasi dengan *Product Owner* (PO) terkait jadwal *Sprint Review* setidaknya H-1 dari *deadline*, agar waktu mulai untuk sprint berikutnya tidak mundur
2. Meningkatkan intensitas komunikasi antar-PIC komponen yang saling bergantung untuk meminimalkan *mismatch* saat penggabungan kode

Apa yang perlu dihentikan:

1. Mengerjakan *task* melewati batas *deadline* internal yang sudah disepakati oleh tim
2. Melakukan integrasi fitur secara masif di hari terakhir *sprint*, yang mana sangat berisiko untuk program tidak berhasil terintegrasi secara sempurna

5 Pelaksanaan Sprint 3

5.1 Sprint Planning

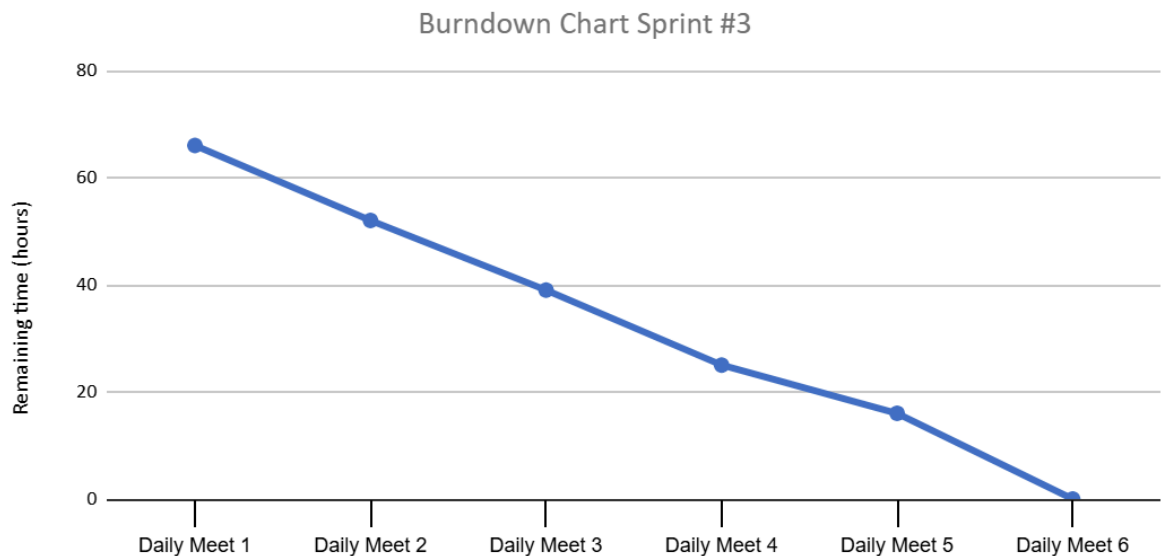

Gambar 5.1 Burndown Chart Sprint 3

Sprint Goal:

1. Revisi Sprint 2 (FE belum *fetch* real data ke BE)
2. Membangun formulir pengisian data LKPS per prodi melalui *spreadsheet* digital
3. Membangun formulir pengisian narasi LED per prodi menggunakan *rich text editor*
4. Mengimplementasi penyimpanan draft otomatis dan manual untuk LKPS dan LED
5. Membangun fitur manajemen unggahan dokumen *evidence* beserta *tagging* ke indikator
6. Membangun *repository* dokumen contoh dan template untuk Super Admin

Tabel 5.1 Sprint Backlog

ID	Task	Description	Estimas i Waktu (jam)	ID Product Backlog	PIC
S-03-01	Sprint 2 Revision	-Dashboard prodi datanya diubah menjadi non <i>dummy data</i>	3	PB-08	Ardell Aghna Mahendra
S-03-02	LKPS <i>Import Parsing</i> Revision	Memperbaiki dan mengimplementasi logika <i>parsing</i> otomatis data dari <i>file Excel</i> LKPS yang diimport	4	PB-17	Hasri Fayadh Muqaffa
S-03-03	DB Migration for LKPS <i>Form</i>	Menambahkan <i>model</i> pada schema <i>prisma</i> untuk data kuantitatif LKPS per kriteria/indikator dan per kategori infokom/LAM Teknik	2	PB-11	Hasri Fayadh Muqaffa
S-03-04	LKPS <i>Form</i> Endpoint Setup	Mendaftarkan route CRUD formulir LKPS pada router	1	PB-11	Hasri Fayadh Muqaffa
S-03-05	LKPS <i>Form API</i> Functionalities	Mengimplementasi logika bisnis pengisian, pembaruan, dan pengambilan data	4	PB-11	Hasri Fayadh Muqaffa

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimas i Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
		kuantitatif LKPS per tabel/kriteria dan per kategori infokom/LAM Teknik			
S-03-06	FE LKPS <i>Form</i> Page	Membuat halaman formulir LKPS dengan tampilan <i>spreadsheet</i> digital, validasi input angka, dan navigasi antar kriteria berdasarkan kategori infokom/LAM Teknik	4	PB-11	I Made Wiweka Putera
S-03-07	LKPS <i>Form Integration & Testing</i>	Integrasi end-to-end halaman LKPS dengan <i>API</i> , <i>unit test</i> dan <i>integration test</i> endpoint	2	PB-11	I Made Wiweka Putera
S-03-08	DB Migration for LED <i>Form</i>	Menambahkan <i>model</i> pada <i>schema.prisma</i> untuk menyimpan narasi LED berdasarkan kategori infokom/LAM Teknik	2	PB-12	Andri Nurdianto
S-03-09	LED <i>Form</i> Endpoint Setup	Mendaftarkan route CRUD formulir LED pada router	1	PB-12	Andri Nurdianto
S-03-10	LED <i>Form API</i> Functionalities	Mengimplementasi logika bisnis penyusunan, pembaruan, dan pengambilan narasi LED berdasarkan kategori infokom/LAM Teknik	4	PB-12	Andri Nurdianto
S-03-11	FE LED <i>Form</i> Page	Membuat halaman formulir LED dengan integrasi <i>rich text editor</i> (bold, tabel, bullet) dan navigasi antar kriteria berdasarkan kategori infokom/LAM Teknik	4	PB-12	Ardell Aghna Mahendra
S-03-12	LED <i>Form Integration & Testing</i>	Integrasi end-to-end halaman LED dengan <i>API</i> , <i>unit test</i> dan <i>integration test</i> endpoint	2	PB-12	Ardell Aghna Mahendra
S-03-13	Auto & Manual <i>Save Draft API</i> LKPS	Mengimplementasi mekanisme <i>auto-save</i> (debounce) di <i>backend</i> dan endpoint <i>save draft</i> manual untuk LKPS	3	PB-13	Hasri Fayadh Muqaffa
S-03-14	Auto & Manual <i>Save Draft API</i> LED	Mengimplementasi mekanisme <i>auto-save</i> (debounce) di <i>backend</i> dan endpoint <i>save draft</i> manual untuk LED	3	PB-13	Andri Nurdianto
S-03-15	FE Auto & Manual <i>Save Integration</i> LKPS	Mengintegrasikan mekanisme <i>auto-save</i> dan tombol "Simpan Draft" manual di halaman LKPS	3	PB-13	I Made Wiweka Putera
S-03-16	FE Auto & Manual <i>Save Integration</i> LED	Mengintegrasikan mekanisme <i>auto-save</i> dan tombol "Simpan Draft" manual di halaman LED	3	PB-13	Ardell Aghna Mahendra

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimas i Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
S-03-17	DB Migration for <i>Evidence</i>	Menambahkan <i>model Evidence</i> pada <i>schema.prisma</i> dengan relasi ke indikator/kriteria akreditasi	2	PB-15	Muhamad Nazih Najmudin
S-03-18	<i>Evidence</i> Endpoint Setup	Mendaftarkan route <i>upload</i> , <i>tagging</i> , dan <i>delete evidence</i> pada router	1	PB-15	Muhamad Nazih Najmudin
S-03-19	<i>Evidence Upload & Tagging API</i> Functionalities	Mengimplementasi logika bisnis <i>upload file evidence</i> ke storage, validasi <i>format/ukuran</i> , dan <i>tagging</i> ke indikator akreditasi	4	PB-15	Muhamad Nazih Najmudin
S-03-20	FE <i>Evidence</i> Management Page	Membuat halaman <i>evidence</i> dengan fitur <i>upload file</i> , <i>form detail</i> dokumen, <i>dropdown tagging</i> indikator, dan daftar <i>evidence</i> yang sudah diunggah	4	PB-15	Muhamad Nazih Najmudin
S-03-21	<i>Evidence Integration & Testing</i>	Integrasi end-to-end halaman <i>evidence</i> dengan <i>API</i> , <i>unit test</i> dan <i>integration test</i> endpoint	2	PB-15	Muhamad Nazih Najmudin
S-03-22	Template <i>Repository</i> Endpoint Setup & <i>API</i>	Mengimplementasi endpoint <i>upload</i> dan pengambilan daftar template LKPS/LED ke storage untuk Super Admin	3	PB-16	Muhamad Nazih Najmudin
S-03-23	FE Template <i>Repository</i> Page	Membuat halaman <i>repository</i> template untuk Super Admin dengan fitur <i>upload</i> dan <i>download</i> template LKPS/LED	3	PB-16	Muhamad Nazih Najmudin
S-03-24	Template <i>Repository</i> Integration & Testing	Integrasi end-to-end halaman <i>repository</i> dengan <i>API</i> , <i>unit test</i> endpoint	2	PB-16	Muhamad Nazih Najmudin

5.2 Daily Meeting

5.2.1. Daily Meeting ke-1

Tabel 5.2 Status Kanban Board Daily Meeting 1

<i>Daily Meet 1</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
	S-03-01					
S-03-02						
		S-03-03				
	S-03-04					
S-03-05						
		S-03-06				
	S-03-07					

	S-03-08					
		S-03-09				
S-03-10						
		S-03-11				
S-03-12						
S-03-13						
S-03-14						
S-03-15						
S-03-16						
S-03-17						
S-03-18						
S-03-19						
S-03-20						
S-03-21						
	S-03-22					
		S-03-23				
	S-03-24					

Tabel 5.3 Laporan Progres *Daily Meeting* 1

No	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	<i>Sprint Planning</i>	S-03-23 FE Template <i>Repository</i> Page
2	Andri Nurdianto		S-03-09
3	Ardell Aghna Mahendra		S-03-11
4	Hasri Fayadh Muqaffa		S-03-03
5	I Made Wiweka Putera		S-03-06

Tabel 5.4 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 1

No	Hambatan
1	Terdapat pemisahan kategori akreditasi prodi menjadi LAM Teknik/Infokom

5.2.2. *Daily Meeting* ke-2

Tabel 5.5 Status *Kanban Board Daily Meeting* 2

<i>Daily Meet 2</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Progress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
			S-03-01			

S-03-02						
					S-03-03	
			S-03-04			
	S-03-05					
					S-03-06	
		S-03-07				
		S-03-08				
					S-03-09	
S-03-10						
					S-03-11	
S-03-12						
S-03-13						
S-03-14						
	S-03-15					
	S-03-16					
S-03-17						
S-03-18						
S-03-19						
	S-03-20					
S-03-21						
		S-03-22				
					S-03-23	
			S-03-24			

Tabel 5.6 Laporan Progres *Daily Meeting 2*

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-03-23	S-03-22 Template <i>Repository</i> Endpoint Setup & <i>API</i> S-03-24 Template <i>Repository</i> <i>Integration & Testing</i>
2	Andri Nurdianto	S-03-09	S-03-08
3	Ardell Aghna Mahendra	S-03-11	S-03-01
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-03-03	S-03-04
5	I Made Wiweka Putera	S-03-06	S-03-07

Tabel 5.7 Daftar Hambatan *Daily Meeting 2*

No	Hambatan

5.2.3. Daily Meeting ke-3

Tabel 5.8 Status Kanban Board Daily Meeting 3

Daily Meet 3						
Open	To Do	Ready	Work-In-Progress	Review	Testing	Closed
					S-03-01	
S-03-02						
					S-03-03	
					S-03-04	
		S-03-05				
					S-03-06	
				S-03-07		
				S-03-08		
					S-03-09	
S-03-10						
					S-03-11	
S-03-12						
	S-03-13					
S-03-14						
			S-03-15			
			S-03-16			
	S-03-17					
S-03-18						
	S-03-19					
		S-03-20				
S-03-21						
				S-03-22		
					S-03-23	
					S-03-24	

Tabel 5.9 Laporan Progres Daily Meeting 3

No	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-03-22, S-03-24	S-03-20 FE Evidence Management Page
2	Andri Nurdianto	S-03-08	S-03-10
3	Ardell Aghna Mahendra	S-03-01	S-03-16
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-03-04	S-03-05
5	I Made Wiweka Putera	S-03-07	S-03-15

Tabel 5.10 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 3

N o	Hambatan

5.2.4. *Daily Meeting* ke-4

Tabel 5.11 Status *Kanban Board Daily Meeting* 4

<i>Daily Meet 4</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
					S-03-01	
	S-03-02					
					S-03-03	
					S-03-04	
				S-03-05		
					S-03-06	
					S-03-07	
					S-03-08	
					S-03-09	
	S-03-10					
					S-03-11	
	S-03-12					
		S-03-13				
	S-03-14					
				S-03-15		
				S-03-16		
			S-03-17			
	S-03-18					
			S-03-19			
				S-03-20		
	S-03-21					
					S-03-22	
					S-03-23	
					S-03-24	

Tabel 5.12 Laporan Progres *Daily Meeting* 4

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-03-20	S-03-19 <i>Evidence Upload & Tagging</i> <i>API Functionalities</i> S-03-17

			DB Migration for <i>Evidence</i>
2	Andri Nurdianto	-	S-03-10
3	Ardell Aghna Mahendra	S-03-16	S-03-12
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-03-05	S-03-13
5	I Made Wiweka Putera	S-03-15	S-03-15 (finalisasi)

Tabel 5.13 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 4

N o	Hambatan

5.2.5. *Daily Meeting* ke-5

Tabel 5.14 Status *Kanban Board Daily Meeting* 5

<i>Daily Meet 5</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
					S-03-01	
			S-03-02			
					S-03-03	
					S-03-04	
					S-03-05	
					S-03-06	
					S-03-07	
					S-03-08	
					S-03-09	
			S-03-10			
					S-03-11	
			S-03-12			
					S-03-13	
			S-03-14			
					S-03-15	
					S-03-16	
					S-03-17	
			S-03-18			
					S-03-19	
					S-03-20	
			S-03-21			
					S-03-22	
					S-03-23	

					S-03-24	
--	--	--	--	--	---------	--

Tabel 5.15 Laporan Progres *Daily Meeting 5*

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-03-19, S-03-17	S-03-18 <i>Evidence</i> Endpoint Setup S-03-21 <i>Evidence Integration & Testing</i>
2	Andri Nurdianto	S-03-10	S-03-14
3	Ardell Aghna Mahendra	S-03-12 (sebagian)	S-03-12 (finalisasi)
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-03-13	S-03-02
5	I Made Wiweka Putera	S-03-15 (finalisasi)	-

Tabel 5.16 Daftar Hambatan *Daily Meeting 5*

N o	Hambatan
1	Kebingungan tentang bagaimana cara menghubungkan eviden dengan akreditasi yang sedang berlaku
2	Setiap <i>sheet</i> pada LKPS memiliki kolom yang berbeda-beda sehingga harus di- <i>hardcode</i> pada <i>file config</i>

5.2.6. *Daily Meeting ke-6*

Tabel 5.17 Status *Kanban Board Daily Meeting 6*

<i>Daily Meet 6</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
						S-03-01
						S-03-02
						S-03-03
						S-03-04
						S-03-05
						S-03-06
						S-03-07
						S-03-08
						S-03-09
						S-03-10
						S-03-11
						S-03-12

					S-03-13
					S-03-14
					S-03-15
					S-03-16
					S-03-17
					S-03-18
					S-03-19
					S-03-20
					S-03-21
					S-03-22
					S-03-23
					S-03-24

Tabel 5.18 Laporan Progres *Daily Meeting* 6

No	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-03-23, S-03-22, S-03-24, S-03-20, S-03-19, S-03-17, S-03-18, S-03-21	Dokumen
2	Andri Nurdianto	S-03-14	
3	Ardell Aghna Mahendra	S-03-12	-
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-03-02	
5	I Made Wiweka Putera	-	-

Tabel 5.19 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 6

No	Hambatan

5.3 Sprint Review

Catatan:

1. Terdapat inkonsistensi data prodi pada saat masuk ke halaman eviden.

5.4 Sprint Retrospective

Apa yang perlu dilanjutkan:

1. Pembaruan status pekerjaan pada *Kanban board* yang konsisten dilakukan oleh seluruh anggota tim di setiap *daily meeting*.
2. Sikap proaktif anggota tim dalam menyelesaikan komponen fitur masing-masing secara mandiri sebelum tahap integrasi
3. Keaktifan anggota dalam mengkomunikasikan hambatan secara langsung di dalam grup


Apa yang perlu dimulai:

1. Mengingatkan satu sama lain terkait *task* yang cukup detail agar tidak ada yang terlewat

Apa yang perlu dihentikan:
 - Tidak ada. Semua sejauh ini berjalan dengan baik.

6 Pelaksanaan Sprint 4

6.1 Sprint Planning

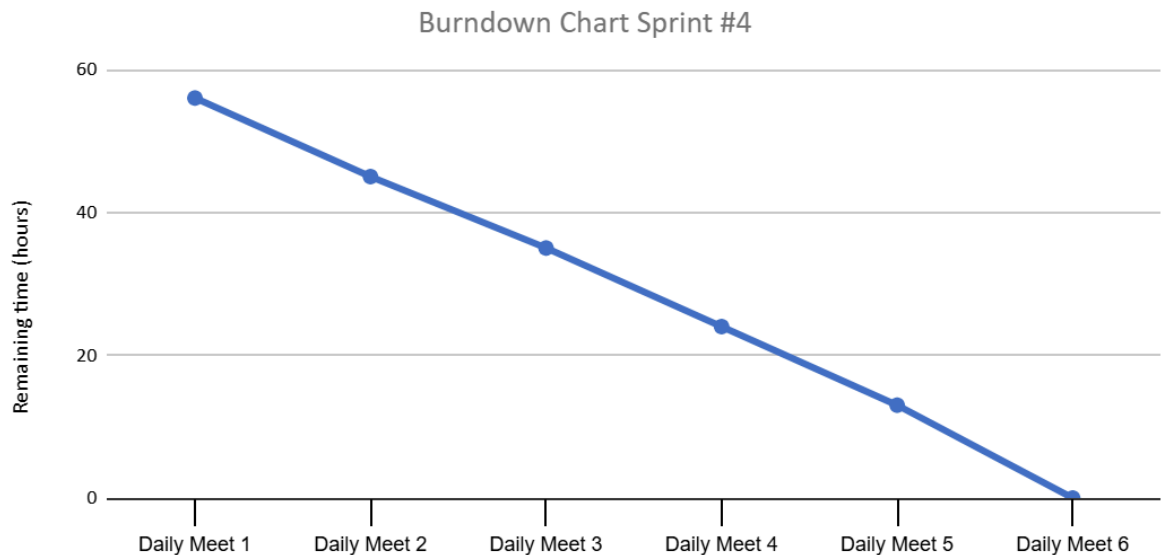

Gambar 6.1 Burndown Chart Sprint 4

Sprint Goal:

1. Melakukan revisi sprint 3
2. Membuat fitur simulasi skor akreditasi
3. Membuat mekanisme penguncian data (draft/final)
4. Membuat Sinkronisasi pusat data institusi
5. Membuat *Early Warning* dan *Notification System*
6. Membuat manajemen sertifikat dan masa berlaku akreditasi

Tabel 6.1 *Sprint Backlog*

ID	Task	Description	Estimas i Waktu (jam)	ID Product Backlog	PIC
S-04-01	Sprint 3 Revision untuk <i>Evidence</i>	Memperbaiki nama prodi untuk pengisian <i>evidence</i>	3	PB-15	Muhamad Nazih Najmudin
S-04-02	DB Migration for Simulasi Skor Akreditasi	Menambahkan <i>model</i> pada schema <i>prisma</i> untuk menyimpan skor simulasi akreditasi terkini	2	PB-21	Andri Nurdianto
S-04-03	Simulasi Skor Akreditasi Endpoint Setup	Menambahkan route untuk simulasi skor akreditasi	1	PB-21	Andri Nurdianto
S-04-04	Simulasi Skor Akreditasi <i>API</i> Functionality	Mengimplementasi logika bisnis untuk menentukan skor akreditasi berdasarkan dokumen yang diunggah oleh prodi	4	PB-21	Andri Nurdianto

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimas i Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
S-04-05	Simulasi Skor Akreditasi <i>Integration & Testing</i>	Integrasi end-to-end halaman simulasi skor akreditasi, <i>unit test</i> dan <i>integration test</i> endpoint	3	PB-21	Andri Nurdianto
S-04-06	FE Simulasi Skor Akreditasi	Membuat tampilan halaman simulasi skor akreditasi	2	PB-21	Andri Nurdianto
S-04-07	Mekanisme Penguncian Data Endpoint Setup	Menambahkan route untuk mekanisme penguncian data endpoint setup	1	PB-22	Muhamad Nazih Najmudin
S-04-08	Mekanisme Penguncian Data <i>API</i> Functionality	Mengimplementasi logika bisnis untuk mengubah status draft menjadi final agar dokumen tidak bisa diubah kembali	3	PB-22	Muhamad Nazih Najmudin
S-04-09	FE Mekanisme Penguncian Data	Membuat tampilan mekanisme penguncian	2	PB-22	Muhamad Nazih Najmudin
S-04-10	Mekanisme Penguncian Data <i>Integration & Testing</i>	Integrasi end-to-end halaman mekanisme penguncian data, <i>unit test</i> dan <i>integration test</i> endpoint	2	PB-22	Muhamad Nazih Najmudin
S-04-11	DB Migration for Sinkronisasi Pusat Data Institusi	Menambahkan <i>model</i> pada schema <i>prisma</i> untuk menyimpan data sinkronisasi pusat data institusi	2	PB-23	Hasri Fayadh Muqaffa
S-04-12	Sinkronisasi Pusat Data Institusi Endpoint Setup	Menambahkan route untuk sinkronisasi pusat data institusi	1	PB-23	Hasri Fayadh Muqaffa
S-04-13	Sinkronisasi Pusat Data Institusi <i>API</i> Functionality	Mengimplementasi logika bisnis untuk data kuantitatif terpusat. Serta sinkron otomatis ke LKPS seluruh 11 program studi	3	PB-23	Hasri Fayadh Muqaffa
S-04-14	Sinkronisasi Pusat Data Institusi <i>Integration & Testing</i>	Integrasi end-to-end halaman sinkronisasi pusat data institusi, <i>unit test</i> dan <i>integration test</i> endpoint	2	PB-23	Hasri Fayadh Muqaffa
S-04-15	FE Sinkronisasi Pusat Data Institusi	Membuat tampilan sinkronisasi pusat data institusi	2	PB-23	Hasri Fayadh Muqaffa
S-04-16	<i>Early Warning</i> dan <i>Notification</i> Endpoint Setup	Menambahkan route untuk mekanisme <i>early warning</i> dan notification	2	PB-24	I Made Wiweka Putera
S-04-17	<i>Early Warning</i> dan <i>Notification API</i> Functionality	Mengimplementasi logika bisnis untuk memberikan warning dan notifikasi ke tim prodi sesuai dengan batas yang ditentukan	3	PB-24	I Made Wiweka Putera

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimas i Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
S-04-18	FE <i>Early Warning</i> dan <i>Notification</i>	Membuat tampilan untuk menampilkan <i>early warning</i> dan <i>notification</i> ke tim prodi	2	PB-24	I Made Wiweka Putera
S-04-19	<i>Early Warning</i> dan <i>Notification Integration & Testing</i>	Integrasi end-to-end <i>early warning</i> dan <i>notification</i> ke Admin dan Dekanat/Bukabag, <i>unit test</i> dan <i>integration test</i> endpoint	2	PB-24	I Made Wiweka Putera
S-04-20	DB Migration for manajemen sertifikat dan masa berlaku akreditasi	Menambahkan <i>model</i> pada schema <i>prisma</i> untuk menyimpan data sertifikat dan masa berlaku akreditasi	2	PB-26	Ardell Aghna Mahendra
S-04-21	Manajemen Sertifikat dan Masa Berlaku akreditasi Endpoint Setup	Menambahkan route untuk manajemen sertifikat dan masa berlaku akreditasi	1	PB-26	Ardell Aghna Mahendra
S-04-22	Manajemen Sertifikat dan Masa Berlaku Akreditasi <i>API</i> Functionality	Mengimplementasi logika bisnis untuk mengunggah sertifikat akreditasi dan mengatur masa berlaku akreditasi	3	PB-26	Ardell Aghna Mahendra
S-04-23	Manajemen Sertifikat dan Masa Berlaku Akreditasi <i>Integration & Testing</i>	Integrasi end-to-end halaman manajemen sertifikat dan masa berlaku akreditasi, <i>unit test</i> dan <i>integration test</i> endpoint	3	PB-26	Ardell Aghna Mahendra
S-04-24	FE Manajemen Sertifikat dan Masa Berlaku Akreditasi	Membuat tampilan halaman manajemen sertifikat dan masa berlaku akreditasi	2	PB-26	Ardell Aghna Mahendra
S-04-25	Sprint 3 Revision untuk LED	Membuat fitur <i>upload</i> foto untuk LED dan fitur hyperlink LED	3	PB-12	Ardell Aghna Mahendra

6.2 Daily Meeting

6.2.1. Daily Meeting ke-1

Tabel 6.2 Status *Kanban Board* Daily Meeting 1

<i>Daily Meet 1</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
S-04-01						
		S-04-02				
	S-04-03					
S-04-04						
S-04-05						
	S-04-06					
	S-04-07					
		S-04-08				

S-04-09						
S-04-10						
		S-04-11				
	S-04-12					
S-04-13						
S-04-14						
S-04-15						
		S-04-16				
	S-04-17					
S-04-18						
S-04-19						
		S-04-20				
	S-04-21					
	S-04-22					
S-04-23						
S-04-24						
S-04-25						

Tabel 6.3 Laporan Progres *Daily Meeting* 1

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	<i>Sprint Planning</i>	S-04-08
2	Andri Nurdianto		S-04-02
3	Ardell Aghna Mahendra		S-04-20
4	Hasri Fayadh Muqaffa		S-04-11
5	I Made Wiweka Putera		S-04-16

Tabel 6.4 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 1

N o	Hambatan

6.2.2. *Daily Meeting* ke-2

Tabel 6.5 Status *Kanban Board Daily Meeting* 2

<i>Daily Meet 2</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
S-04-01						
					S-04-02	

			S-04-03			
	S-04-04					
S-04-05						
S-04-06						
		S-04-07				
					S-04-08	
S-04-09						
S-04-10						
					S-04-11	
			S-04-12			
	S-04-13					
S-04-14						
S-04-15						
					S-04-16	
		S-04-17				
	S-04-18					
S-04-19						
					S-04-20	
			S-04-21			
			S-04-22			
S-04-23						
	S-04-24					
S-04-25						

Tabel 6.6 Laporan Progres *Daily Meeting 2*

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-04-08	S-04-07
2	Andri Nurdianto	S-04-02	S-04-03
3	Ardell Aghna Mahendra	S-04-20	S-04-21, S-04-22
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-04-11	S-04-12
5	I Made Wiweka Putera	S-04-16	S-04-17

Tabel 6.7 Daftar Hambatan *Daily Meeting 2*

N o	Hambatan

6.2.3. Daily Meeting ke-3

Tabel 6.8 Status *Kanban Board Daily Meeting 3*

<i>Daily Meet 3</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
S-04-01						
					S-04-02	
				S-04-03		
			S-04-04			
S-04-05						
	S-04-06					
				S-04-07		
					S-04-08	
	S-04-09					
S-04-10						
					S-04-11	
				S-04-12		
			S-04-13			
	S-04-14					
S-04-15						
					S-04-16	
				S-04-17		
		S-04-18				
S-04-19						
					S-04-20	
				S-04-21		
				S-04-22		
	S-04-23					
		S-04-24				
S-04-25						

Tabel 6.9 Laporan Progres *Daily Meeting 3*

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-04-07	S-04-09
2	Andri Nurdianto	S-04-03	S-04-04
3	Ardell Aghna Mahendra	S-04-21, S-04-22	S-04-24
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-04-12	S-04-13
5	I Made Wiweka Putera	S-04-17	S-04-18 S-04-19

Tabel 6.10 Daftar Hambatan *Daily Meeting 3*

Program Studi Teknik Informatika ITB	IF-ITB-IF3250-PPL-2024	Halaman 45/ dari 59 halaman
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika-ITB, serta bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik Informatika ITB.		

N o	Hambatan
1	LED dan LKPS yang telah diimplementasikan sebelumnya memiliki perbedaan yang cukup jauh terkait versioning pada fitur <i>upload</i> dan <i>form</i> . Sehingga menyulitkan dalam pembuatan mekanisme pengunciannya.

6.2.4. Daily Meeting ke-4

Tabel 6.11 Status *Kanban Board Daily Meeting 4*

<i>Daily Meet 4</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
	S-04-01					
					S-04-02	
					S-04-03	
				S-04-04		
	S-04-05					
			S-04-06			
					S-04-07	
					S-04-08	
			S-04-09			
	S-04-10					
					S-04-11	
					S-04-12	
				S-04-13		
			S-04-14			
	S-04-15					
					S-04-16	
					S-04-17	
				S-04-18		
	S-04-19					
					S-04-20	
					S-04-21	
					S-04-22	
			S-04-23			
				S-04-24		
	S-04-25					

Tabel 6.12 Laporan Progres *Daily Meeting 4*

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	-	S-04-09
2	Andri Nurdianto	S-04-04	S-04-06
3	Ardell Aghna Mahendra	S-04-24	S-04-23
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-04-13	S-04-14
5	I Made Wiweka Putera	S-04-18	S-04-19

Tabel 6.13 Daftar Hambatan *Daily Meeting 4*

N o	Hambatan

6.2.5. *Daily Meeting ke-5*

Tabel 6.14 Status *Kanban Board Daily Meeting 5*

<i>Daily Meet 5</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
			S-04-01			
					S-04-02	
					S-04-03	
					S-04-04	
		S-04-05				
				S-04-06		
					S-04-07	
					S-04-08	
				S-04-09		
			S-04-10			
					S-04-11	
					S-04-12	
					S-04-13	
				S-04-14		
		S-04-15				
					S-04-16	
					S-04-17	
					S-04-18	
		S-04-19				
					S-04-20	
					S-04-21	

					S-04-22	
				S-04-23		
					S-04-24	
			S-04-25			

Tabel 6.15 Laporan Progres *Daily Meeting 5*

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-04-09	S-04-10
2	Andri Nurdianto	S-04-06	S-04-05
3	Ardell Aghna Mahendra	S-04-23	S-04-25
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-04-14	S-04-15
5	I Made Wiweka Putera	S-04-19	S-04-19

Tabel 6.16 Daftar Hambatan *Daily Meeting 5*

N o	Hambatan

6.2.6. Daily Meeting ke-6

Tabel 6.17 Status *Kanban Board Daily Meeting 6*

<i>Daily Meet 6</i>						
<i>Open</i>	<i>To Do</i>	<i>Ready</i>	<i>Work-In-Prog ress</i>	<i>Review</i>	<i>Testing</i>	<i>Closed</i>
						S-04-01
						S-04-02
						S-04-03
						S-04-04
						S-04-05
						S-04-06
						S-04-07
						S-04-08
						S-04-09
						S-04-10
						S-04-11
						S-04-12

					S-04-13
					S-04-14
					S-04-15
					S-04-16
					S-04-17
					S-04-18
					S-04-19
					S-04-20
					S-04-21
					S-04-22
					S-04-23
					S-04-24
					S-04-25

Tabel 6.18 Laporan Progres *Daily Meeting* 6

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-04-07, S-04-08, S-04-09, S-04-10	-
2	Andri Nurdianto	S-04-05	-
3	Ardell Aghna Mahendra	S-04-25	-
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-04-15	-
5	I Made Wiweka Putera	S-04-19	-

Tabel 6.19 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 6

N o	Hambatan

6.3 Sprint Review

Catatan:

1. Mekanisme sinkronisasi data masih belum final, sehingga memerlukan penyesuaian kembali berdasarkan sistem yang telah berjalan sesuai dengan arahan product owner.
2. Masih terdapat beberapa error kecil, seperti kesalahan locking

6.4 Sprint Retrospective

Apa yang perlu dilanjutkan:

1. Semangat saling meng-cover tugas kritis yang sulit diselesaikan.
2. Status yang terbuka sesama anggota yang memudahkan meninjau ketersediaan sumber daya anggota.


Apa yang perlu dimulai:

1. Pengerjaan laporan sebaiknya dimulai segera di akhir sprint
2. Persiapan matang menuju sprint 5.

Apa yang perlu dihentikan:

1. Pengorganisasian beban tugas yang kurang baik.
2. Kurangnya *Attention to detail*. Sprint ini masih banyak meninggalkan ketidaksempurnaan fungsional. Fungsionalitas sudah berjalan, namun masih banyak kekurangan.

7 Pelaksanaan Sprint 5

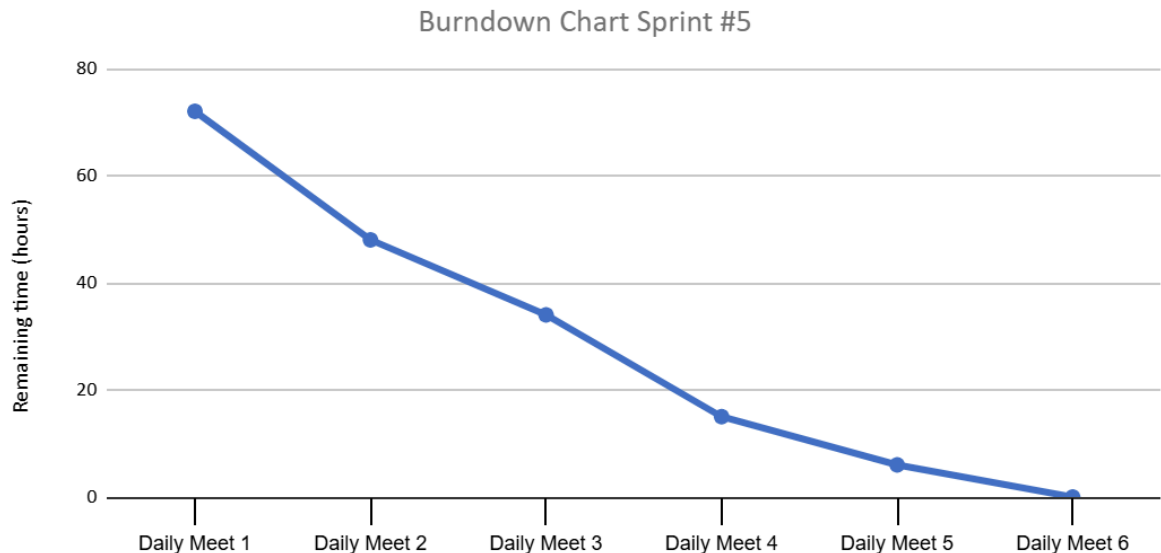

Gambar 7.1 Burndown Chart Sprint 5

7.1 Sprint Planning

Sprint Goal:

1. Melakukan perbaikan menyeluruh terhadap bug dan error yang ditemukan dari akumulasi seluruh sprint keberjalanan proyek.
2. Melakukan penyesuaian konsistensi visual, mencakup sidebar, page, dan toast.
3. Menyiapkan lingkungan deployment dan menyesuaikan konfigurasi production aplikasi
4. Melakukan pengetesan akhir fungsionalitas aplikasi.

Tabel 7.1 *Sprint Backlog*

ID	Task	Description	Estimas i Waktu (jam)	ID Product Backlog	PIC
S-05-01	Sprint 4 Review Adjustments (BE)	Mengeksekusi penyesuaian logika <i>backend</i> , <i>database</i> , atau perbaikan arsitektur berdasarkan hasil dari Sprint 4 Review: 1. Perubahan status dokumen sebaiknya dikasih <i>alert</i> 2. Error pada bagian notifikasi dan mekanisme locking	2-4	N/A	Hasri Fayadh Muqaffa
S-05-02	Sprint 4 Review Adjustments (FE)	Mengeksekusi perubahan <i>layout</i> , navigasi, atau penambahan elemen visual di frontend berdasarkan hasil dari Sprint 4 Review.	2-4	N/A	Hasri Fayadh Muqaffa

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimas i Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
S-05-03	PB-25 Endpoint Setup & API Logic	Membuat <i>model</i> , relasi <i>database</i> , dan logika <i>API</i> untuk fitur penambahan catatan monitoring & evaluasi pada indikator LKPS, LED, dan <i>Evidence</i> .	4	PB-25	Hasri Fayadh Muqaffa
S-05-04	PB-25 FE UI & Integration	Membangun antarmuka (modal/ <i>form</i>) untuk fitur monitoring dan riwayat evaluasi, lalu mengintegrasikannya dengan <i>API</i> dari <i>backend</i> .	4	PB-25	Hasri Fayadh Muqaffa
S-05-05	PB-25 Integration Testing & Refinement	Melakukan <i>unit test</i> dan integrasi sistem khusus untuk PB-25 guna memastikan aliran data <i>review</i> tersimpan dengan baik.	2	PB-25	Hasri Fayadh Muqaffa
S-05-06	Heavy Bug Fixing - BE & Logic	Menyelesaikan bug kompleks terkait logika bisnis (<i>heavy logic</i>), sinkronisasi nilai akreditasi, dan agregasi <i>dashboard</i> .	6	N/A	I Made Wiweka Putera
S-05-07	Heavy Bug Fixing - FE State & Sync	Menyelesaikan bug terkait <i>state management</i> di frontend (contoh: data tidak ter- <i>update</i> setelah klik simpan tanpa refresh).	5	N/A	I Made Wiweka Putera
S-05-08	Bug Fixing - Data Integrity & Auth	Memperbaiki masalah keamanan route, inkonsistensi data, dan memastikan validasi <i>token</i> berjalan sempurna.	4	N/A	I Made Wiweka Putera
S-05-09	Bug Fixing & Alignment - UI/UX & Responsiveness	Memperbaiki dan menyelaraskan style elemen UI, responsivitas di layar kecil, dan merapikan komponen design system. (contoh: konsistensi <i>sidebar</i> , card, font, dsb.)	5	N/A	Ardell Aghna Mahendra
S-05-10	Custom UI Alerts Refactoring	Mengganti native <i>alert</i> (<i>window.alert</i> / <i>window.confirm</i>) dengan komponen UI interaktif (<i>Toast/SweetAlert/Dialog</i> bawaan design system) secara global.	4	N/A	Ardell Aghna Mahendra
S-05-11	FE Global Error Pages & Boundaries	Membuat dan mendesain halaman khusus untuk <i>error</i> handling 404 (<i>Not Found</i>) dan 500 (<i>Server Error</i>), dll. serta <i>Error Boundaries</i> di React.	4	N/A	Ardell Aghna Mahendra

<i>ID</i>	<i>Task</i>	<i>Description</i>	<i>Estimas i Waktu (jam)</i>	<i>ID Product Backlog</i>	<i>PIC</i>
S-05-12	BE Global <i>Error</i> Handler Formatting	Menyeragamkan <i>format JSON</i> balasan dari <i>server</i> ketika terjadi <i>error</i> (400, 401, 403, 404, 500) agar mudah diparsing oleh frontend.	3	N/A	Muhamad Nazih Najmudin
S-05-13	<i>Cloud Storage</i> Setup & <i>Integration</i>	Mengkonfigurasi layanan <i>cloud storage</i> pihak ketiga (contoh: AWS S3 / GCS) untuk menggantikan penyimpanan <i>file evidence & LED</i> lokal (/uploads).	5	PB-04	Andri Nurdianto
S-05-14	<i>Server Deployment & CI/CD</i> Prod	Menyiapkan <i>environment production</i> (VPS / Vercel / Railway, dsb.), mengatur <i>reverse proxy</i> Nginx, <i>SSL</i> , dan menyesuaikan <i>.gitlab-ci.yml</i> .	6	PB-04	Andri Nurdianto
S-05-15	Prod DB Migration & Env Config	Melakukan migrasi <i>database</i> utama ke <i>production</i> , menyiapkan seeding akun Super Admin, dan memastikan <i>file .env production</i> aman.	4	PB-04	Andri Nurdianto
S-05-16	<i>Environment-Specific</i> Bug Fixing	Menangani <i>error CORS, routing</i> , atau <i>file permission</i> yang hanya muncul saat aplikasi sudah di-deploy ke <i>environment production</i> .	4	PB-04	Muhamad Nazih Najmudin
S-05-17	End-to-End System <i>Integration Test</i>	Melakukan Quality Control (QC) menyeluruh dari <i>login</i> hingga ekspor laporan di <i>environment staging/production</i>	3	PB-04	Muhamad Nazih Najmudin
S-05-18	Final Code Review & Refactoring	Melakukan code review terakhir, membersihkan kode-kode console.log, data <i>dummy</i> , dan modul yang tidak terpakai (<i>dead code</i>).	3	N/A	Muhamad Nazih Najmudin

7.2 Daily Meeting

7.2.1. Daily Meeting ke-1

Tabel 7.2 Status Kanban Board Daily Meeting 1

Daily Meet 1						
Open	To Do	Ready	Work-In-Pro gress	Review	Testing	Closed
S-05-01						
S-05-02						
		S-05-03				
S-05-04						

S-05-05						
		S-05-06				
S-05-07						
S-05-08						
		S-05-09				
S-05-10						
S-05-11						
		S-05-12				
S-05-13						
		S-05-14				
S-05-15						
S-05-16						
S-05-17						
S-05-18						

Tabel 7.3 Laporan Progres *Daily Meeting* 1

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	<i>Sprint Planning</i>	S-05-12
2	Andri Nurdianto		S-05-14
3	Ardell Aghna Mahendra		S-05-09
4	Hasri Fayadh Muqaffa		S-05-03
5	I Made Wiweka Putera		S-05-06

Tabel 7.4 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 1

N o	Hambatan

7.2.2. *Daily Meeting* ke-2

Tabel 7.5 Status Kanban Board *Daily Meeting* 2

Daily Meet 2						
Open	To Do	Ready	Work-In-Pro gress	Review	Testing	Closed
		S-05-01				
			S-05-02			
					S-05-03	
S-05-04						

S-05-05						
					S-05-06	
S-05-07						
		S-05-08				
					S-05-09	
		S-05-10				
S-05-11						
					S-05-12	
S-05-13						
					S-05-14	
S-05-15						
S-05-16						
S-05-17						
S-05-18						

Tabel 7.6 Laporan Progres *Daily Meeting 2*

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-05-12	S-05-16
2	Andri Nurdianto	S-05-14	S-05-15
3	Ardell Aghna Mahendra	S-05-09	S-05-10
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-05-03	S-05-01, S-05-02
5	I Made Wiweka Putera	S-05-06	S-05-08

Tabel 7.7 Daftar Hambatan *Daily Meeting 2*

N o	Hambatan

7.2.3. *Daily Meeting ke-3*

Tabel 7.8 Status Kanban Board *Daily Meeting 3*

Daily Meet 3						
Open	To Do	Ready	Work-In-Pro gress	Review	Testing	Closed
					S-05-01	
					S-05-02	
					S-05-03	
		S-05-04				

		S-05-05				
					S-05-06	
			S-05-07			
					S-05-08	
					S-05-09	
					S-05-10	
		S-05-11				
					S-05-12	
	S-05-13					
					S-05-14	
	S-05-15					
	S-05-16					
S-05-17						
S-05-18						

Tabel 7.9 Laporan Progres *Daily Meeting* 3

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	-	S-05-16
2	Andri Nurdianto	-	S-05-15
3	Ardell Aghna Mahendra	S-05-10	S-05-11
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-05-01, S-05-02	S-05-04, S-05-05
5	I Made Wiweka Putera	S-05-08	S-05-07

Tabel 7.10 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 3

N o	Hambatan

7.2.4. *Daily Meeting* ke-4

Tabel 7.11 Status *Kanban Board Daily Meeting* 4

Daily Meet 4						
Open	To Do	Ready	Work-In-Pro gress	Review	Testing	Closed
					S-05-01	
					S-05-02	
					S-05-03	
				S-05-04		

				S-05-05		
					S-05-06	
				S-05-07		
					S-05-08	
					S-05-09	
					S-05-10	
				S-05-11		
					S-05-12	
				S-05-13		
					S-05-14	
				S-05-15		
			S-05-16			
		S-05-17				
	S-05-18					

Tabel 7.12 Laporan Progres *Daily Meeting* 4

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	Dokumen teknis	S-05-16
2	Andri Nurdianto	S-05-15	S-05-13
3	Ardell Aghna Mahendra	S-05-11	Poster
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-05-04, S-05-05	Dokumen teknis
5	I Made Wiweka Putera	S-05-07	Dokumen teknis

Tabel 7.13 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 4

N o	Hambatan

7.2.5. *Daily Meeting* ke-5

Tabel 7.14 Status *Kanban Board Daily Meeting* 5

Daily Meet 5						
Open	To Do	Ready	Work-In-Pro gress	Review	Testing	Closed
					S-05-01	
					S-05-02	
					S-05-03	
					S-05-04	

					S-05-05	
					S-05-06	
					S-05-07	
					S-05-08	
					S-05-09	
					S-05-10	
					S-05-11	
					S-05-12	
					S-05-13	
					S-05-14	
					S-05-15	
				S-05-16		
			S-05-17			
			S-05-18			

Tabel 7.15 Laporan Progres *Daily Meeting 5*

No	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-05-16	S-05-17, S-05-18
2	Andri Nurdianto	Dokumen teknis	S-05-17
3	Ardell Aghna Mahendra	Dokumen teknis	S-05-17
4	Hasri Fayadh Muqaffa	Dokumen teknis	S-05-17
5	I Made Wiweka Putera	Dokumen teknis	S-05-17

Tabel 7.16 Daftar Hambatan *Daily Meeting 5*

No	Hambatan
1	Perubahan ke deployment membuat notifikasi tidak berjalan dengan baik
2	LKPS dan sinkronisasi data sangat sulit dilakukan.

7.2.6. Daily Meeting ke-6

Tabel 7.17 Status *Kanban Board Daily Meeting 6*

Daily Meet 6						
Open	To Do	Ready	Work-In-Progress	Review	Testing	Closed
						S-05-01
						S-05-02

					S-05-03
					S-05-04
					S-05-05
					S-05-06
					S-05-07
					S-05-08
					S-05-09
					S-05-10
					S-05-11
					S-05-12
					S-05-13
					S-05-14
					S-05-15
					S-05-16
					S-05-17
					S-05-18

Tabel 7.18 Laporan Progres *Daily Meeting* 6

N o	Nama	Yang sudah dikerjakan	Yang akan dikerjakan
1	Muhamad Nazih Najmudin	S-05-17, S-05-18	Video
2	Andri Nurdianto	S-05-17	Video
3	Ardell Aghna Mahendra	S-05-17	Video
4	Hasri Fayadh Muqaffa	S-05-17	Video
5	I Made Wiweka Putera	S-05-17	Video

Tabel 7.19 Daftar Hambatan *Daily Meeting* 6

N o	Hambatan
1	Hasil ketidakrapihan sprint-sprint sebelumnya membuat banyak sekali kecacatan dalam program yang baru teridentifikasi
2	Hal ini membuat perbaikan massal perlu dilakukan.
3	Alur sprint 5 cenderung blocking, sehingga sulit untuk mengatur pekerjaan.

7.3 Sprint Retrospective

Temuan retrospektif pada sprint ini kebanyakan merupakan akumulasi ketidaksempurnaan sprint-sprint sebelumnya yang baru disadari pada sprint 5 ini. Berikut adalah hal-hal yang perlu dievaluasi:

1. Kurangnya perencanaan yang matang sejak sprint 1 terkait konsep dan arsitektur proyek sehingga ketidakjelasan ini mulai terasa di sprint 5.

2. Seluruh sprint sebelum ini selalu diakhiri tanpa integrasi keberlanjutan yang baik terhadap sprint sebelumnya, seakan terdapat mindset “yang penting sprint ini selesai” tanpa memikirkan apa yang perlu disesuaikan secara global dari pekerjaan sebelumnya.
3. CI/CD deployment tidak berjalan sejak awal sprint 1, hal ini membuat sprint 5 harus dikerjakan ekstra untuk menyiapkan deployment.
